

KONYA-KARAMAN ARASI ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram - Çumra
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat Makine Teçhizat
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	38.268.011 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KONYA-KARAMAN ARASININ SİNYALİZASYON VE TELEKOMÜNİKASYONA TESİSLERİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram - Çumra
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat Makine Teçhizat
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2019
PROJE MALİYETİ	77.546.894 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	27
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Teknik bina, inşaat ve kablo serilim işleri devam etmektedir. Ekipman montajlarına başlanmış olup Haziran 2019'da devreye alınması planlanmaktadır.



KONYA - KARAMAN - ULUKIŞLA ELEKTRİFİKASYON PROJESİ KAPSAMINDA TRAFİKO MERKEZLERİNE ENERJİ NAKİL HATTI ÇEKİLMESİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram - Çumra - Ereğli
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat Makine Teçhizat
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	3.086.634 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KONYA-KARAMAN ARASI İSTASYONLARIN TEVSİATLARININ YAPILMASI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram - Çumra
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat Teçhizat
BAŞLAMA YILI	2017
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	27.263.582 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KONYA-KAŞINHANI İSTASYONLARI ARASI KM. 6+710 'DA VASITA ALT GEÇİT YAPILMASI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat
BAŞLAMA YILI	2017
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	8.255.408 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.




KONYA-KAŞINHANI İSTASYONLARI ARASI KM. 19+900 'DA VASITA ALT GEÇİT YAPILMASI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Meram
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat
BAŞLAMA YILI	2017
BİTİŞ YILI	2018
PROJE MALİYETİ	3.621.803 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	100
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tamamlandı.



KARAMAN-ULUKIŞLA ARASI 135 KM. 2.HAT YAPILMASI ALTYAPI VE ÜSTYAPI İŞLERİ

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ereğli
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat
BAŞLAMA YILI	2016
BİTİŞ YILI	2019
PROJE MALİYETİ	295.683.638 TL
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	49
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İmalatlar devam etmektedir.

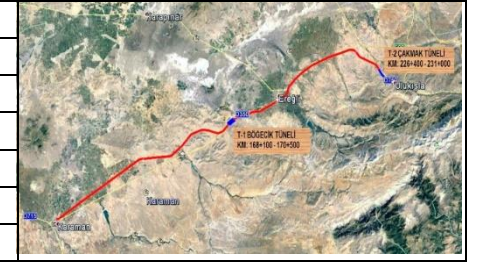

KARAMAN-ULUKIŞLA ARASI SİNYALİZASYON TELEKOMÜNİKASYON TESİSLERİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ereğli	
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat Makine Teçhizat	
BAŞLAMA YILI	2016	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	48.326.185 TL	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Tasarım çalışmaları devam etmektedir. Üstyapı tamamlanan kesimlerde yapımına başlanması hedeflenmektedir. Proje 2021 yılında tamamlanacaktır.	

KARAMAN-ULUKIŞLA ARASI ELEKTRİFİKASYON TESİSLERİ YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ereğli	
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat Makine Teçhizat	
BAŞLAMA YILI	2016	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	Proje hazırlama çalışmaları tamamlandı. Yapım ihalesi hazırlıkları devam ediyor.	

ÇUMRA HIZLI TREN İSTASYONU YAPIMI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Çumra	
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat Makine Teçhizat	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	

ARIKÖREN DEMİRYURT İSTASYONLARI ARASI KM:66+500 DE TARIMSAL ALT GEÇİT YAPILMASI

PROJENİN UYGULANDIĞI İLÇE	Ereğli	
KARAKTERİSTİĞİ	İnşaat Makine Teçhizat	
BAŞLAMA YILI	2018	
BİTİŞ YILI	2019	
PROJE MALİYETİ	-	
İŞİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (%)	-	
PROJE VE PROJENİN GELDİĞİ SON AŞAMA HAKKINDA BİLGİ	İhale aşamasında.	
